MOSIGO

MOSIGO 서비스기획 연계
사업성 ·투자 조건 검토

서비스 설계 → 운영 조건 → 사업모델 → 예산 심의

신사업 투자 검토안

개인 전략기획 사례 · 산정 기준 기반 분석

신사업 투자 판단 요약

199건
초기 월 완료 산정 기준

3,700원
제휴 모델 공헌이익 / 건

1,082건
월 손익분기점 · 기회비용 포함

18.4%
손익분기점 대비 예상 완료

제안 결론

기존 사업자 제휴 우선 | 8주 검증 후 연차별 성장 투자

수요

이용·지불 의향과 재예약 확인

공급

지역·시간별 공급과 안전 책임 확인

경제성

고객 획득·지원 비용과 완료율 측정

수치 : 투자 검토용 기준 시나리오 · 단계별 자원 배분과 성장전략 제시

예약자와 이용자가 다른 신사업 기회

지불 주체 ·서비스 이용자 ·제휴 공급자의 가치와 운영 조건

자녀 · 예약자

비교 ·예약 ·진행 확인의 편의

핵심 질문 : 지불 의향은 있는가 ?

부모 · 이용자

동의 ·안전 ·동행 품질

핵심 질문 : 이용 의향은 있는가 ?

제휴 사업자 · 공급자

가용 시간 ·단가 ·보험 ·사고 책임

핵심 질문 : 안정적 공급이 가능한가 ?

핵심 검증 질문 예약 편의가 유료 수요로 이어지는가 ? 동의와 운영 책임을 계약으로 정할 수 있는가 ?

출처 : MOSIGO 기존 조사 ·개인 분석 | 수요 ·지불 의향은 검증 대상

시장 기회에서 투자 가능한 수요까지

시장 인구 → 후보 생활권 → 공급·전환 가능한 시장 정의

전체 참고 인구

약 258 만 명

2026.10 주민등록 2,578,873명 · 유료 수요 별도 확인

서비스 가능 범위

재산정 필요

종전 약 154 만 명 · 시군·기준월 재산정 전

장기 고객 목표

약 1.5 만 명

장기 목표 · 초기 공급과 구분

연 거래액 9 억 원

15,000명 × 연 1.5회 × 40,000원 · 거래액 산정 기준

투자 판단 기준 생활권별 수요·대체재·고객 유입·매니저 공급·전환 성과

출처 : 행안부 2026.10 주민등록 인구 · 인구는 유료 수요와 구분

제휴 중심 신사업 운영모델

제품 경쟁력과 제휴 운영 책임을 분리해 투자 부담 관리

01 가족 등록 › 02 병원·조건 탐색 › 03 매니저 비교 › 04 대리 신청·동의 › 05 진행 공유 › 06 이력·재예약

현재 사례에서 설계·구현한 범위

예약 소유권 · 공유 권한
상태 복구 · 운영자 화면
서비스 흐름·검수 기준

후속 운영·계약 검증 대상

파트너 계약·보험·현장 안전
결제·정산·취소·민감정보
실거래 품질·고객 지원

운영 확인 항목 : 계약·안전·결제·서비스 품질

제휴 모델의 단위 경제성

계약 ·수수료 조건과 획득 ·지원 비용을 반영한 건당 공헌이익

고객 결제액

40,000원

플랫폼 수수료율 산정 기준 20%

수수료 매출 8,000원

플랫폼 매출은 거래액의 수수료 부분


결제 수수료 3%	−1,200원
고객 지원 비용	−1,200원
시스템 비용	−100원
고객 획득 비용 평균 *	−1,800원

공헌이익 / 완료 거래 **3,700원**

* 신규 고객 비중 60% × 신규 고객 획득 비용 3,000원 . 월 고정비 ·인력 기회비용은 별도

공급 상한과 손익분기점

월 서비스 완료 건수

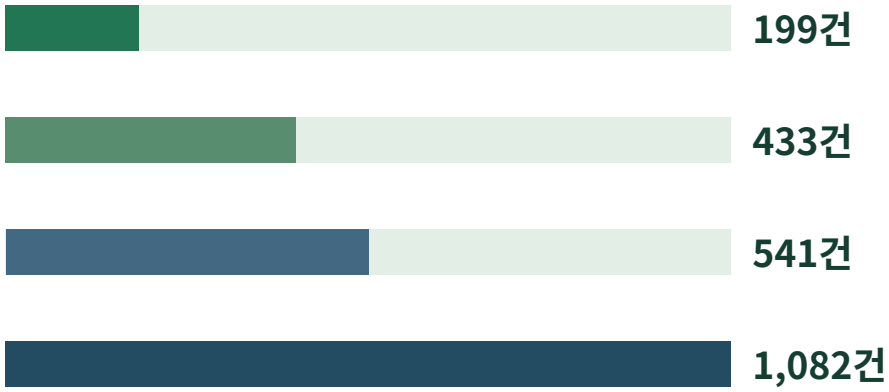

공급 상한과 현금 손익분기 차이 · 월 108건

월 손익 · 시나리오

−126.4만 원

현금 고정비 반영

−326.4만 원

인력 기회비용까지 반영

월 손익 : 199건 × 3,700원 − 4,000,000원 = −3,263,700원 · 손익분기점 : 4,000,000 ÷ 3,700 을 올려 1,082건

조건 변화에 따른 손익 대응

변경 조건	월 완료	건당 공헌이익	월 손익 *	검토 항목
기준	199건	3,700원	**-3,263,700원**	공급·비용 점검
플랫폼 이용 80→60%	149건	3,700원	**-3,448,700원**	플랫폼 이용률 관리
고객 획득 비용 2 배	199건	1,900원	**-3,621,900원**	유입 채널 점검
취소율 10→20%	177건	3,700원	**-3,345,100원**	취소 영향 점검

제휴 공급을 확보하고 고객 확보·지원 비용을 줄입니다.

* 현금 고정비 200만 원과 인력 기회비용 200만 원을 반영했습니다. 추가 지원·환불 비용은 별도입니다.

단계별 투자 승인 및 성과관리

8주 검증 결과를 1년 차 사업모델 확정과 연계

1	1~2주	**수요 ·책임 정의** **통과 조건 · 고객 수요 ·동의 기준 기록**	자녀 ·부모 인터뷰를 준비하고 제휴 후보를 확인합니다 .
2	3~4주	**공급 ·상품 검증** **4주차 · 수요·공급·책임 조건 충족 시 제한 거래 승인, 미충족 시 보류**	가용 시간 ·단가 ·운영 책임과 가격 수용도를 확인합니다 .
3	5~8주	**제한 거래 검증** **통과 조건 · 완료 ·비용 실측값 확보**	유료 전환 ·완료 ·취소와 고객 확보 ·지원 비용을 측정합니다 .
4	8주차	**후속 투자 심의** **8주차에 운영 성과와 예산을 심의하고, 첫 동행 완료 후 90일에 재예약을 평가합니다.**	실측 결과와 예산 집행액 , 추가 현금 소요를 검토합니다 .

신사업 초기 투자 예산 · 400만 원

단계별 내부 승인 요청 (가안)

400만 원

8주 고정비 내 배분 상한

인력 기회비용 400만 원 별도 · 총 800만 원

내부 파일럿 예산안 · 외부 조달 조건과 구분

1~2주 — 80만 원

수요 조사 ·동의 ·안전 검증 준비

3~4주 — 120만 원

제휴 조건 확인 ·품질 검수

5~8주 — 200만 원

제한 운영 ·지표 측정 ·예외 대응

예산 편성 기준 · 현금 고정비 200만 원 × 2개월

실제 집행액은 단계별 확인 · 경제적 비용은 별도

구축 ·보험 ·법무 ·환불 ·추가 판촉비는 별도입니다 .

3개년 신사업 성장 ·투자 로드맵

제휴 검증 → 지역 확대 → 기업 ·공공 채널 다각화

1년 차	제휴 사업모델 정교화	공급 ·원가 ·고객 반응으로 투자 기준 확정
2년 차	인접 생활권 ·제휴 네트워크 확대	지역별 공헌이익 ·운영비로 자원 배분
3년 차	기업 ·공공 협력 모델 검토	반복 이용 ·채널별 고객 확보 비용 ·수익성 비교
자원 배분	제휴 ·서비스 ·IT 투자 우선순위 조정	수요 ·공급 ·현금 소요에 따른 단계별 승인
투자 심의	확대 ·개선 ·보류 판단 기준 운영	계약 ·안전 책임과 90일 재예약 후속 평가

투자 규모와 시점은 검증 결과에 따라 조정

서비스 운영 전 투자 승인 조건

8주 검증 착수 여부 결정

확대 투자는 수요 ·공급 ·손익 실측 후 별도 심의

단계별 투자 승인 기준 3 가지

① 초기 투자 · 제휴 공급 ·고객 수요 ·비용 조건 확인
② 확대 투자 · 지역별 공헌이익 ·현금 소요 평가
③ 성장 투자 · 반복 수요 ·채널별 경제성 분석

4주차 제한 거래 승인 · 보류, 8주차 후속 투자 심의, 첫 동행 완료 후 90일 재예약 평가.

출처 : mosigo-case-study.vercel.app | 개인 전략기획 ·투자 검토안
